


APPEL A PROJETS (Initiative de l'ADER)

Phase	Etape	Actions	Durée approximative	Responsable
<b>SELECTION OPERATEUR</b>	01	Planification régionale		ADER
	02	Validation des plans indicatifs		MdE
	03	Sélection des régions sujettes à l'Appel à projet	01	ADER/MdE
	04	Missions de reconnaissance dans les régions concernées	10-30 jours	ADER
	05	Mise à jour des plans indicatifs	5-10 jours	ADER
	06	Regroupement en lots des projets identifiés	01 jour	ADER/MdE
	07	Elaboration du cahier des charges de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI)	05 jours	ADER
	08	Envoi du dossier à l'ORE pour avis technique	01 jour	ADER
	09	Lancement de l'AMI	15 -30 jours	ADER/MdE
	10	Séance d'informations sur l'AMI	01 jour	ADER
	11	Evaluation des offres et sélection d'une liste restreinte pour l'appel à projet	5 -10 jours	ADER
	12	Elaboration du cahier des charges de l'appel à projets	05 jours	ADER
	13	Envoi du dossier à IORE pour avis technique	01 jour	ADER
	14	Lancement de l'appel à projets	180 jours	ADER/MdE
	15	Séance d'informations sur l'appel à projet	01 jour	ADER
	16	Evaluation des offres et sélection de l'opérateur	10 – 15 jours	ADER
	17	Négociation éventuelle	05 jours	ADER/MdE/ Opérateur
<b>REALISATION</b>	18	Information, sensibilisation de la Commune et des futurs abonnés	3 jours	ADER
	19	Rédaction de la convention de partenariat		Commune /Opérateur
	20	Instruction du contrat d'autorisation	03 jours	ADER
	21	Délivrance du contrat d'autorisation	10-15 jours	MdE
	22	Signature de la convention de financement entre ADER et opérateur	05 jours	ADER /Opérateur
	23	Visa CDE	15 jours	CDE
	24	Notification de l'opérateur (Ordre de Service)	01 jour	ADER
	25	Livraison des matériels (s'il y en a)	01 jour	ADER
	26	Paiement de l'acompte de la subvention	10-15 jours	ADER
	27	Démarrage des travaux	02-03 jours	ADER/Opérateur
	28	Suivi de l'avancement des travaux		ADER/Commune
	29	Demande de réception technique		ADER/Opérateur
	30	Réception technique		ADER/MdE/ORE /Opérateur
	31	Branchement des clients	720 jours/ continue	Opérateur
	32	Décompte Générale Définitif (DGD)		ADER/Opérateur /Commune
	33	Clôture de la convention de financement		ADER
	34	Délivrance du certificat de conformité		MdE/ADER
	35	Gestion de l'exploitation	Continue	Opérateur
	36	Suivi de l'exploitation	Continue	Commune/ADER/ORE/ MdE

# Phase Sélection Opérateur

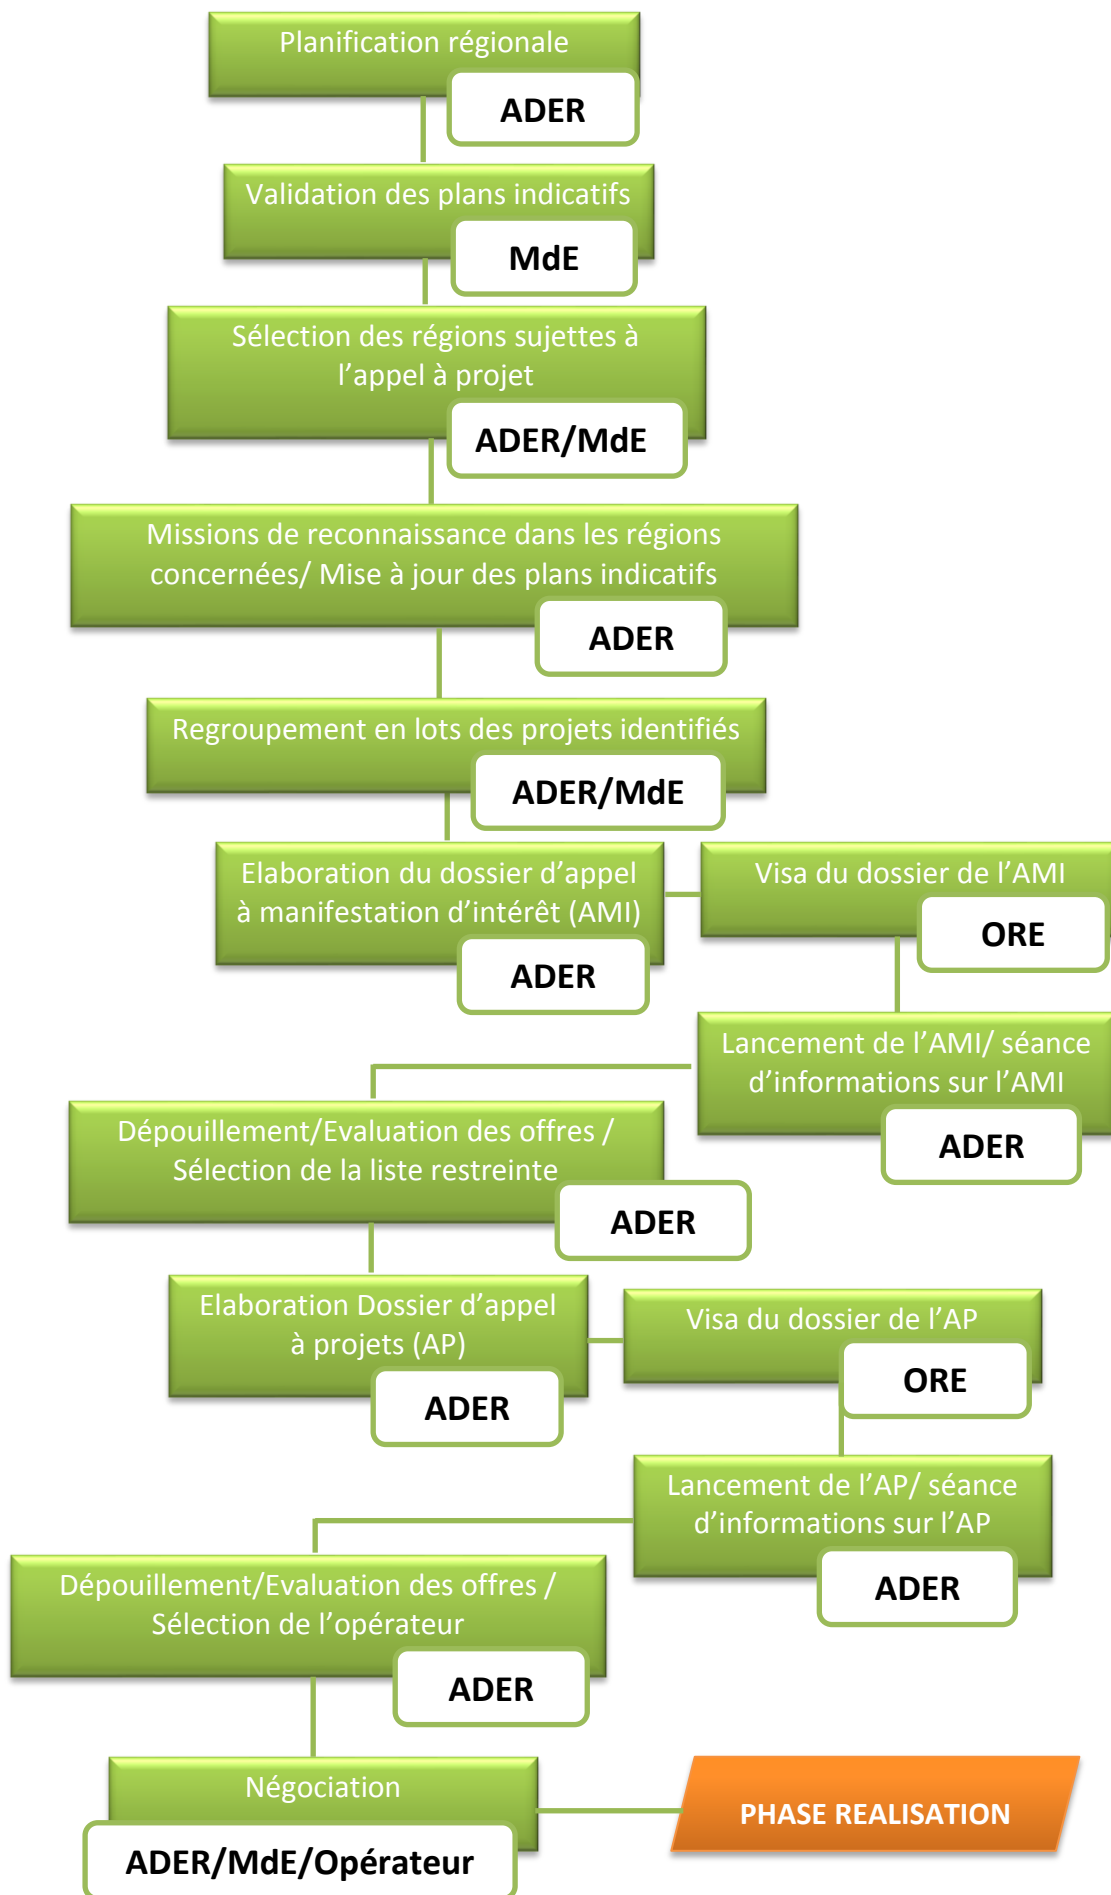

## Phase Réalisation

