


## CANDIDATURE SPONTANEE

### ➤ Initiative de la Commune

Phase	Etape	Actions	Durée approximative	Responsable
SELECTION OPERATEUR	01	Demande d'électrification à l'ADER + données nécessaires (voir modèle)	1 jour	Commune
	02	Traitement de la demande	05 jours	ADER
		<i>Si étude APD disponible =&gt; étape 08</i>		
		<i>Si étude non disponible =&gt; étape 03</i>		
	03	Elaboration cahier de charge pour l'étude APD	10 jours	ADER
	04	Lancement Appel d'offre pour l'étude APD		ADER/ARMP/ Partenaire
	05	Réalisation étude APD	30-60 jours	Bureau d'études
	06	Validation étude (technique, financière ...)	15-30 jours	ADER
	07	Réponse à la Commune		ADER
		<i>Si Non : réponse motivée du report du projet</i>		
		<i>Si Oui : Etape 08</i>		
	08	Elaboration Dossiers d'appel à candidature (DAC)	5 -10 jours	ADER
	09	Visa technique	5 -10 jours	ORE
10	Lancement appel à candidature	15-30 jours	ADER	
11	Dépouillement, évaluation des dossiers	5-10 jours	ADER/MdE	
12	Choix du permissionnaire/Concessionnaire	01 jour	ADER/MdE	
13	Négociation éventuelle	05 jours	ADER/MdE/ Opérateur	
REALISATION	14	Information, sensibilisation de la Commune et des futurs abonnés	3 jours	ADER
	15	Rédaction de la convention de partenariat		Commune /Opérateur
	16	Instruction du contrat d'autorisation	03 jours	ADER
	17	Délivrance du contrat d'autorisation	10-15 jours	MdE
	18	Signature de la convention de financement entre ADER et opérateur	05 jours	ADER /Opérateur
	19	Visa CDE	15 jours	CDE
	20	Notification de l'opérateur (Ordre de Service)	01 jour	ADER
	21	Livraison des matériels (s'il y en a)	01 jour	ADER
	22	Paiement de l'acompte de la subvention	10-15 jours	ADER
	23	Démarrage des travaux	02-03 jours	ADER/Opérateur
	24	Suivi de l'avancement des travaux		ADER/Commune
	25	Demande de réception technique		ADER/Opérateur
	26	Réception technique		ADER/MdE/ORE /Opérateur
	27	Branchement des clients	720 jours/ continue	Opérateur
	28	Décompte Générale Définitif (DGD)		ADER/Opérateur /Commune
	29	Gestion de l'exploitation	Continue	Opérateur
	30	Suivi de l'exploitation	Continue	Commune/ADER/O RE/MdE

# Phase Sélection Opérateur

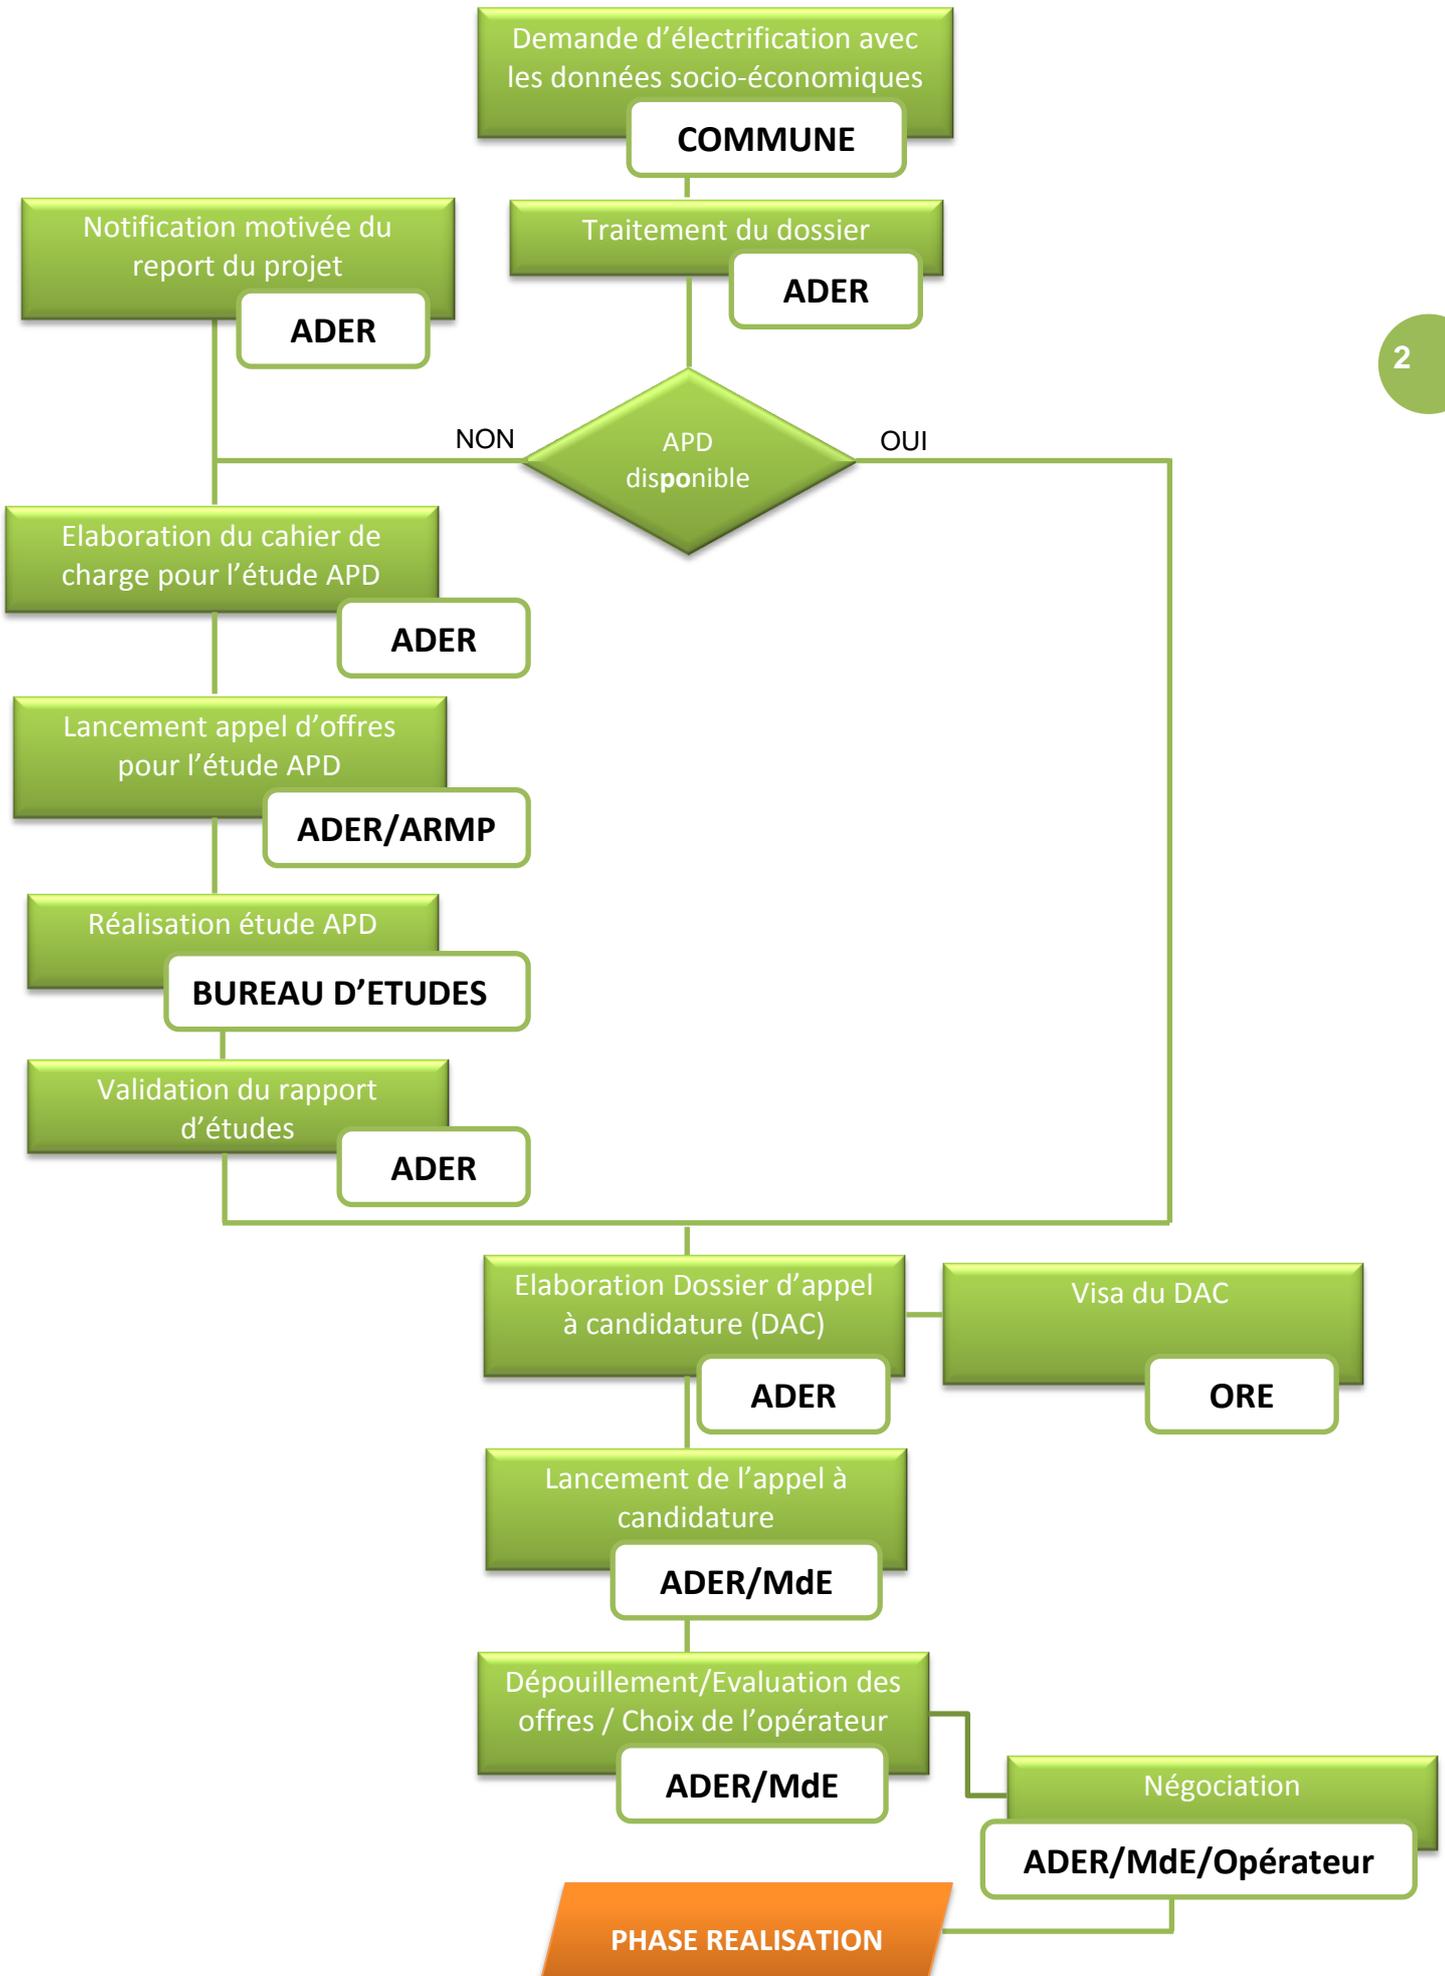

## Phase Réalisation

