


## CANDIDATURE SPONTANEE

### ➤ Initiative d'un opérateur

Phase	Etape	Actions	Durée approximative	Acteurs
<b>PREPARATION DOSSIER</b>	01	Dépôt de la manifestation d'intérêt auprès de la Commune	01 jour	Opérateur
	02	Accord de principe de la Commune sur la réalisation du projet d'électrification	01 jour	Commune / Conseil Communal
	03	Etudes de reconnaissance		Opérateur
	04	Demande de permis préliminaire	01 jour	Opérateur
	05	Examen du dossier de demande de permis préliminaire	05 jours	ADER
	06	Délivrance de l'Autorisation préliminaire (validité 06 mois) + Canevas étude, TDR Etude	01 jour	ADER
	07	Réalisation de l'étude		Opérateur
	08	Envoi de la demande d'électrification à l'ADER + résultats de l'étude réalisée par l'Opérateur	1 jour	Commune
	09	Traitement des dossiers	10-15 jours	ADER
	10	Demande de complément d'informations	5 jours	ADER
	11	Validation de l'étude (technique, financière)	15-30 jours	ADER
	12	Réponse à la Commune <i>Si Non : réponse motivé du rejet</i> <i>Si Oui : Etape 13</i>		ADER
<b>REALISATION</b>	13	Information, sensibilisation de la Commune et des futurs abonnés	3 jours	ADER
	14	Rédaction de la convention de partenariat		Commune /Opérateur
	15	Instruction du contrat d'autorisation	03 jours	ADER
	16	Accord de principe sur la demande de financement		ADER
	17	Délivrance du contrat d'autorisation	10-15 jours	MdE
	18	Signature de la convention de financement entre ADER et opérateur	05 jours	ADER/Opérateur /Partenaire
	19	Visa CDE de la convention de financement	15 jours	CDE
	20	Notification opérateur (Ordre de Service)	01 jour	ADER
	21	Livraison des matériels (s'il y en a)	01 jour	ADER
	22	Paiement de l'acompte de la subvention	10-15 jours	ADER
	23	Démarrage des travaux	02-03 jours	ADER/Opérateur
	24	Suivi de l'avancement des travaux		ADER/Commune
	25	Demande de réception technique		Opérateur
	26	Réception technique		ADER/MdE/ORE/Opérateur /Commune/Partenaire
	27	Branchement des clients	720 jours/ continue	Opérateur
	28	Décompte Générale Définitif (DGD)		ADER/Opérateur /Commune/Partenaire
	29	Clôture de la convention de financement		ADER
	30	Délivrance du certificat de conformité		MdE / ADER
	31	Gestion de l'exploitation	Continue	Opérateur
	32	Suivi de l'exploitation	Continue	Commune/ADER/ORE/MdE

# Phase Préparation dossier

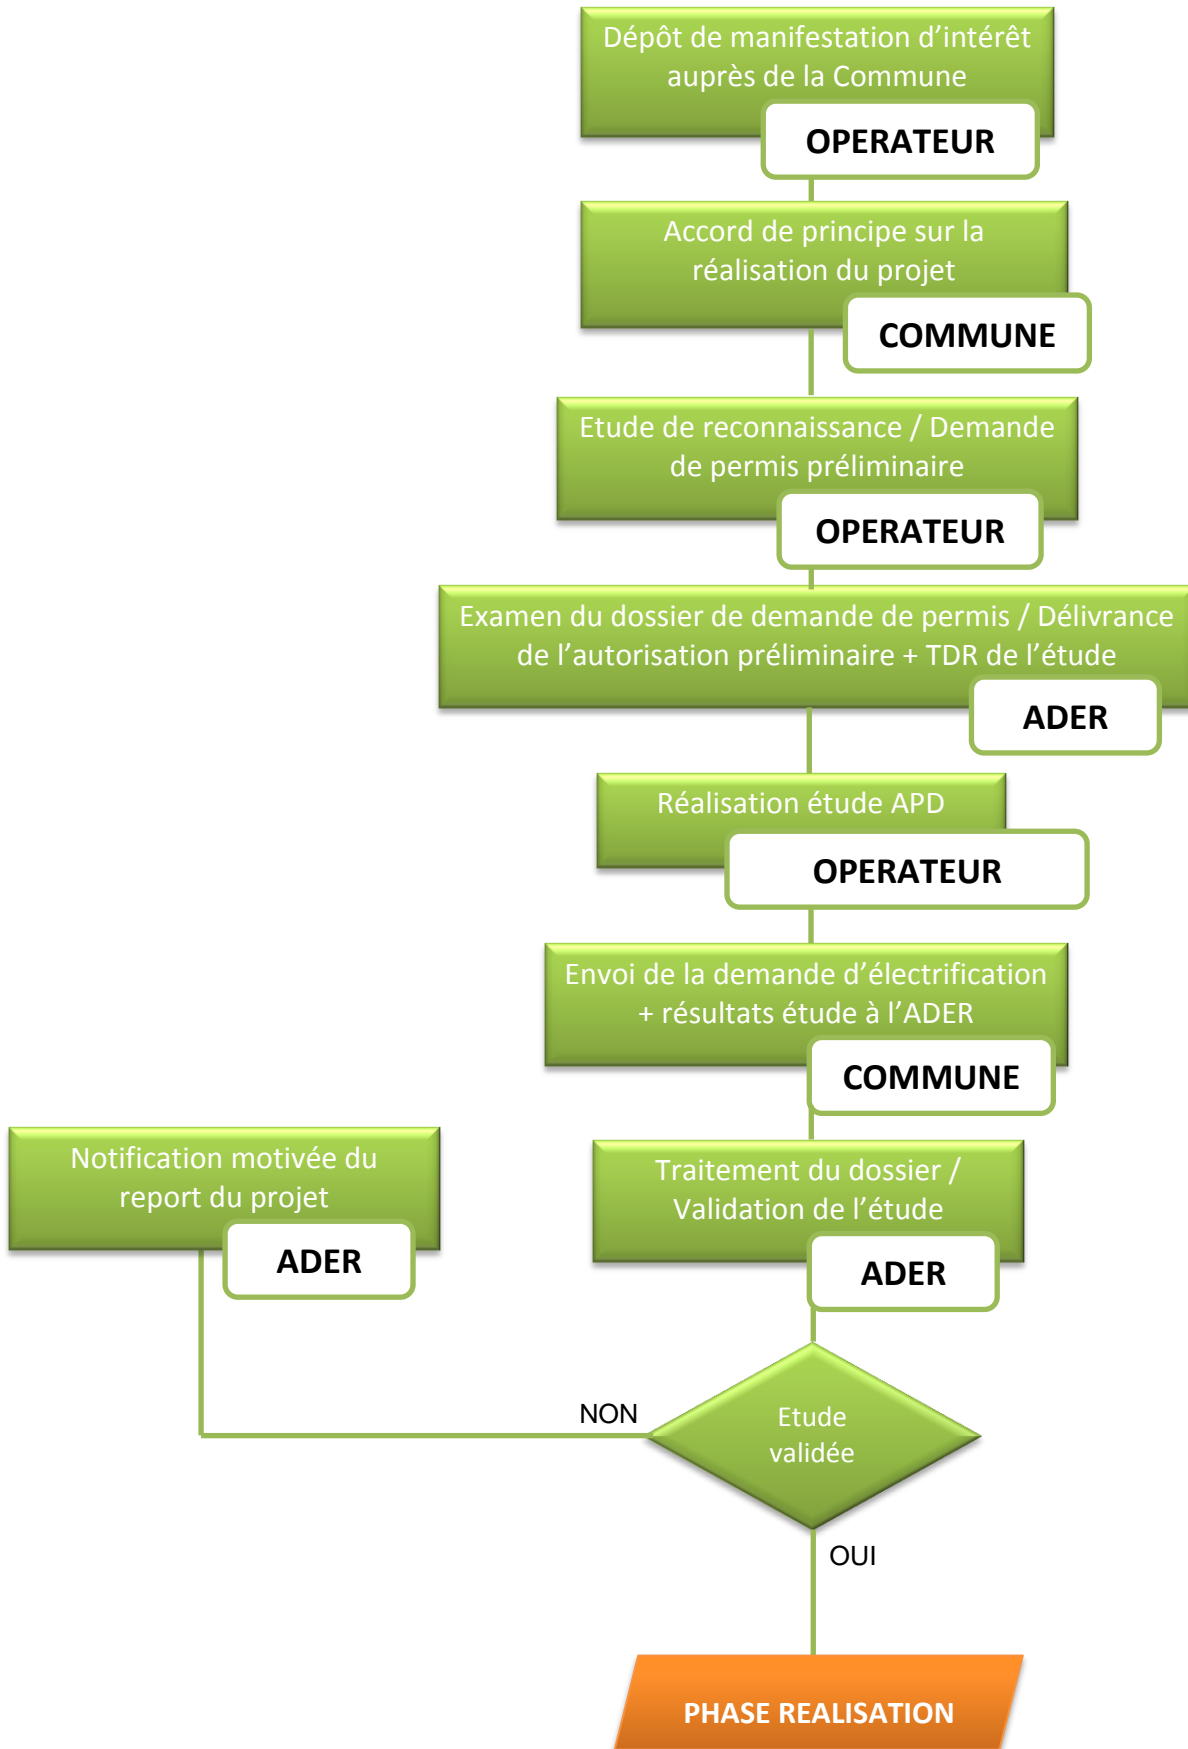

## Phase Réalisation

